

Protokol č. 03/I. 2023 NZ
o vecnom odovzdaní a prevzatí I. etapy stavby:
„Stavebné úpravy Domu smútku na cintoríne Vrakúňa“ v MČ Bratislava –
Vrakúňa

I. Účastníci

Odovzdávajúci : **MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy**
Šafárikovo nám.č.3, 811 02 Bratislava
zastúpené: Ing. Robert Kováč – štatutárny zástupca
IČO: 17 330 190
(ďalej len „**odovzdávajúci**“)

Preberajúci : **Hlavné mesto SR Bratislava**
Prímaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: Ing. Arch. Matúš Vallo – primátor
IČO: 00 603 481
(ďalej len „**preberajúci**“)

II. Dôvod odovzdania

1. Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom budovy súpis. č. 8842 - domu smútku na cintoríne Vrakúňa, situovanej na pozemku registra „C“ KN parc.č. 1236, k.ú. Vrakúňa, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č.1191.

2. V súlade so schválením rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019-2021 bol príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, poskytnutý kapitálový transfer na stavbu: „Stavebné úpravy Domu smútku súp.č. 8842 na cintoríne Vrakúňa“, Bratislava, k.ú. Vrakúňa. Prípadné chýbajúce finančné prostriedky na stavebné úpravy sa príspevková organizácia MARIANUM zaviazala uhradiť z vlastných zdrojov.

3. Na základe vyššie uvedeného, sa vykonané stavebné práce na dome smútku na cintoríne Vrakúňa, ktorých realizáciu zabezpečila príspevková organizácia MARIANUM, v súlade so Zmluvou o nájme č.0883 1069 0700 v znení Dodatkov č.1 až č.5, odovzdávajú do majetku Hlavnému mestu SR Bratislave.

III. Predmet odovzdania

Predmetom odovzdania a prevzatia je I. etapa stavby: „**Stavebné úpravy Domu smútku súp. č. 8842 na cintoríne Vrakuňa**“, ktorá spočívala v obnove stavebných konštrukcií budovy a spevnených plôch.

Miesto stavby: Bratislava, Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
k.ú. Vrakuňa, parc. č. 1236

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava,
zastúpené príspevkovou organizáciou MARIANUM
Šafárikovo nám. č. 3, Bratislava

Zhotoviteľ: SOKOL trade Bratislava s.r.o.
Panónska cesta 34
851 04 Bratislava

Stavebné povolenie / oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác vydala: nepodliehalo stavebnému povoleniu a ani ohláseniu.

Stavebné úpravy boli realizované na základe projektovej dokumentácie vypracovanej architektonickou skupinou ALMÁSSY ČEČETKA, architekti s.r.o., dodávateľskou spoločnosťou SOKOL trade Bratislava s.r.o.

Preberacie konanie sa uskutočnilo dňa 12.3.2022.

IV. Hodnota odovzdávaného a preberaného majetku

Pre účely účtovnej evidencie sa odovzdávaná investícia vykonaná na majetku hlavného mesta SR Bratislavy, rozčleňuje podľa organizačných útvarov Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, vykonávajúcich operatívnu správu nasledovne:

Sekcia správy nehnuteľností – oddelenie geodetických činností, referát evidencie nehnuteľností

Názov majetku		suma v Eur
0219	Mitsova Magdaléna	375,00
0319	Mitsova Magdaléna	375,00
0319	Mitsova Magdaléna	625,00
201914	ALMÁSSY ČEČETKA, architekti s.r.o.	4 200,00
201915	ALMÁSSY ČEČETKA, architekti s.r.o.	7 000,00
0419	Mitsova Magdaléna	2 240,00
19029	Falcon trade, s.r.o.	18 285,00
042019	CYKR expert, s.r.o.	8 900,00

0220	Mitsova Magdaléna	375,00
202032	ALMÁSSY ČEČETKA, architekti s.r.o.	12 600,00
20200033	FICO-kov, s.r.o.	960,00
20211102	SOKOL trade Bratislava s.r.o.	107 997,95
20211202	SOKOL trade Bratislava s.r.o.	63 713,62
201927	ALMÁSSY ČEČETKA, architekti s.r.o.	720,00
202015	ALMÁSSY ČEČETKA, architekti s.r.o.	1 820,00
120200126	GEOMETRES, s.r.o.	985,00
202045	ALMÁSSY ČEČETKA, architekti s.r.o.	31 346,67
20220401	SOKOL trade Bratislava s.r.o.	55 223,61

**Rekonštrukcia domu smútku súp.č. 8842 na cintoríne Vrakuňa
v celkovej hodnote**

317 741,85 EUR

slovom: tristosedemnásttisíc sedemstoštyridsaťjeden eur a 85 centov

V. Ostatné ustanovenia

1. Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
2. Tento Protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Protokol sa vyhotovuje v 6-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých odovzdávajúci obdrží 2 a preberajúci dostane 4 exempláre.
4. Oboje strany si tento protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa : 03. 07. 2023

14. 07. 2023

Za odovzdávajúceho :

Za preberajúceho :

Ing. Robert Kováč
štatutárny zástupca

Ing. arch. Matúš Va
primátor

V prílohe:

1. Kópie citovaných faktúr 17 ks
2. Rozpad zdrojov financovania
3. ZoD vrátane 3 dodatkov, rozpočet
4. Realizačný projekt

Dodávateľ: Magdaléna Mitsova Račianska 65 831 02 Bratislava IČO: 46299467 DIČ:	Faktúra č.: 0219 M daňový doklad
Bank. spojenie: Číslo účtu:	Odberateľ: MARIANUM- Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p. o. Šafárikovo nám. č. 3. 811 02 Bratislava IČO: 17330190
Konštantný symbol : 0308 Faktúra na základe : Dodací list	Dátum vystavenia : 30. 05. 2019 Dátum splatnosti : 13. 06. 2019 Dátum z d. plnenia:

Fakturujem Vám práce realizované na základe Zmluvy o spolupráci a potvrdeného súpisu prác
za obdobie apríl a máj 2019

spolu celkom.....4 500.- €
slovom: štyritisícpäťsto EUR

prílohy: potvrdený výkaz práce

Nie som platcom DPH

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.
ČÍSLO SPISU: 819/2019
PRÍLOHY/LISTY: 1/1
30-05-2019
VYBAVUJE: HARIANUKOVA

.....
dodávateľ

PRÍLOHA K #A
č. 0219

kaz odpracovaných hodín za obdobie:

01.04.2019 - 30.05.2019

názov	počet hodín	hodinová sadzba	celkom	Kapitálové výdavky
Stredisko Rača PD na stavebné konanie, konzultácie...	150	12,50	1 875,00	1 875,00
Martinský cintorín výmena povrchových vrstiev "Ohlásenie stavebných úprav...."	90	12,50	1 125,00	1 125,00
Martinský cintorín obhliadka a technický popis VO DS na PD	90	12,50	1 125,00	
Cintorín Vrakuňa DS konzultácie - výmena výplne otvorov na DS arch. Čečetkom	30	12,50	375,00	375,00
Spolu	360		4 500,00	

47004

517-02

Dodávateľ: Magdaléna Mitsova Račianska 65 831 02 Bratislava IČO:46299467 DIČ:	Faktúra č.: 0319 M daňový doklad
Bank. spojenie: Číslo účtu: SK	Odberateľ: MARIANUM- Pohrebništvo mesta Bratislavy, p. o. Šafárikovo nám. č. 3. 811 02 Bratislava IČO: 17330190 DIČ:2020838182
Konštantný symbol : 0308 Faktúra na základe : Dodací list	Dátum vystavenia : 31. 08. 2019 Dátum splatnosti : 14. 09. 2019 Dátum z d. plnenia:

Fakturujem Vám práce realizované na základe Zmluvy o spolupráci a potvrdeného súpisu prác
za obdobie jún, júl, august 2019

spolu celkom.....6 900.- €
slovom: Šesťtisícdeväťsto EUR

prílohy: potvrdený výkaz práce

Nie som platcom DPH

MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy	
Číslo faktúry:	1252/2019
PRÍLOHY LISTY:	1
03-08-2019	
VYBAVUJE:	
MARIAS/KOVA'	

.....
dodávateľ

Mitsová

Výkaz odpracovaných hodín za obdobie:

01.06.2019 - 31.08.2019

146 41 00706

názov	počet hodín	hodinová sazka	celkom	Kapitálove výdavky cudzíe zdroje	Bežné výdavky
Stredisko Rača PD na stavebné konanie, konzultácie... ✓	100	12,50	1 250,00	1 250,00	-
Martinský cintorín výmena povrchových vrstiev * Ohlásenie stavebných úprav... ✓	90	12,50	1 125,00	1 125,00	-
Martinský cintorín obhliadka a technický popis VO DS na PD ✓	90	12,50	1 125,00		1 125,00
Cintorín Vrakuňa DS konzultácie - výmena výplne otvorov na DS arch. Čechetkom ✓	30	12,50	375,00	375,00	✓
Cintorín Vrakuňa DS rekonštrukcia I. etapy ✓	50	12,50	625,00	625,00	✓
Cintorín Karlova Ves - realizácia novej centrálnej komunikácie ✓	100	12,50	1 250,00	1 250,00	✓
Cintorín Dúbravka - zabezpečenie projektovej dokumentácie a realizácie časti oporných múrov ✓	70	12,50	875,00	875,00	
Oprava pamätníka SNP ✓	22	12,50	275,00		275,00
Spolu	552		6 900,00	4 625,00	

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEL:	ODBERATEL:	FAKTÚRA:
ALMÁSSY ČEČETKA architekti s.r.o. Štefánikova 33, SK-811 05 Bratislava IČO: DIČ: ----- IČDPH: : Spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd BA I Odieľ sro, vložka 43094/B UNICREDITBANK SK64 : J3 Vybavuje:	Marianum - pohrebništvo mesta Bratislavy, p.o. Šafárikovo námestie č.3 SK-811 02 Bratislava IČO: DIČ: ----- IČDPH: Vybavuje: Ing. Jaroslav Hurta 0911 147 541 projekty@marianum.sk	Číslo: 201914 Variabilný symbol: 201914 Konštantný symbol: 308 Objednávka číslo: Dátum vystavenia: 30.9.2019 Dátum dodania: 23.9.2019 Dátum splatnosti: 14.10.2019 Forma úhrady: Bankový prevod

Na základe zmluvy o dielo č. 19/051 Vám fakturujem dodanie:
Realizačného projektu opláštenia
Obnovy Domu smútku na cintoríne Vrakuňa

4 200,00 € bez DPH
840,00 20% DPH
5 040,00 € k úhrade

MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy *S pozdravom*
Ing. arch. Richard Čečetka

ČÍSLO SPISU: 1579/2019

PRÍLOHY/LISTY: 1

-- 1 - 10 - 2019

VYBAVUJE:
MARIANKOVA'

Prácu prevzal: Ing. Boris Šramko
Faktúru prevzal:

Dňa: 23.9.2019
Dňa:

V prípade nezaplatenia v stanovenej lehote Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle §369 a §502 obchodného zákonníka
č.513/A zb. vo výške 0,056% za každý deň omeškania

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEL:	ODBERATEL:	FAKTÚRA:
ALMÁSSY ČEČETKA architekti s.r.o. Štefánikova 33, SK-811 05 Bratislava IČO: 36 698 423 DIČ: 2 IČDPH: Spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd BA I Odvetľ sro, vložka 43094/B UNICREDITBANK SK64 Vybavuje:	Marlanum - pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. Šafárikovo námestie č.3 SK-811 02 Bratislava IČO: DIČ: IČDPH: Vybavuje: Ing. Jaroslav Hurta 0911 147 541 projekty@marlanum.sk	Číslo: 201915 Variabilný symbol: 201915 Konštantný symbol: 308 Objednávka číslo: Dátum vystavenia: 30.9.2019 Dátum dodania: 30.9.2019 Dátum splatnosti: 14.10.2019 Forma úhrady: Bankový prevod

Na základe zmluvy o dielo č. 19/051 Vám fakturujem dodanie:
Architektonické štúdio
Obnovy Domu smútku na cintoríne Vrakuňa

7 000,00 € bez DPH
1 400,00 20% DPH
8 400,00 € k úhrade

S pozdravom

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Ing. arch. Richard Čečetka

ČÍSLO SPISU: 1378/2019

PRÍLOHY/LISTY: 1

- 1 - 10 - 2019

VYBAVUJE:

MARLANUM

Prácu prevzal: Ing. Boris Šramko

Faktúru prevzal:

Dňa: 30.9.2019

Dňa:

V prípade nezaplatenia v stanovenej lehote Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle §369 a §502 obchodného zákonníka
č.513/A zb. vo výške 0,056% za každý deň omeškania

Dodávateľ: Magdaléna Mitsova Račianska 65 831 02 Bratislava IČO:46299467 DIČ:	Faktúra č.: 0419 M daňový doklad
Bank. spojenie: TATRA BANKA Číslo účtu:	Odberateľ: MARIANUM- Pohrebništvo mesta Bratislavy, p. o. Šafárikovo nám. č. 3. 811 02 Bratislava IČO: 17330190
Konštantný symbol : 0308 Faktúra na základe : Dodací list	Dátum vystavenia : 31. 10. 2019 Dátum splatnosti : 14. 11. 2019 Dátum z d. plnenia:
<p>Fakturujem Vám práce realizované na základe Zmluvy o spolupráci a potvrdeného súpisu prác za obdobie september a október 2019</p> <p>spolu celkom..... 4 593,75 €</p> <p>slovom: Štyritisíc päťsto deväťdesiattri EUR, sedemdesiatšesť Centov</p> <p>prílohy: potvrdený výkaz práce</p> <p>Nie som platcom DPH</p> <div style="text-align: right;"> <p>..... dodávateľ</p> </div>	

..... 4 593,75 €

..... Pohrebništvo mesta Bratislavy, p. o.

..... Centov

ČÍSLO SÚISU: 45261 2019

PRÍLOHY: LIST 1

30-10-2019

.....
MARIAUKOVA

Výkaz odpracovaných hodín za obdobie:

02.09.2019 - 31.10.2019

názov	počet hodín	hodinová sadzba	celkom	Kapitálové výdavky cudzie zdroje	Bežné výdavky
Stredisko Rača kontrola úprav školského dvora po dokončení diela ✓	40	12,50	500,00	✓ 473,31	28,79
Martinský cintorín výmena povrchových vrstiev kontrola a konzultácia spádovania plochy žľabov ✓	3,5	12,50	43,75	✓ 40,91	2,84
Martinský cintorín obhliadka a technický popis VO DS oprava ✓	59,5	12,50	743,75		743,75
✓ Cintorín Vrakuňa DS rekonštrukcia I. etapy ✓	160	12,50	2 250,00	2 240,00	10,00
Cintorín Karlova Ves - realizácia novej centrálnej - komunikácie	50,5	12,50	631,25	629,86	1,39
Cintorín Dúbravka - zabezpečenie projektovej dokumentácie a realizácie častí oporných múrov	34	12,50	425,00	425,00	0,00
Spolu	387,5		4 593,75	3 806,98	786,77

Supplier:

Falcon trade, s.r.o.

Sosnová 23

637 00 BRNO

Organization Identification No.: 25345532

Tax ID No.: CZ25345532

Financial institution: Fio banka, a.s.

Account num/Bank code:

IBAN:

SWIFT

INVOICE No. S19029

Constant symbol 0308

Customer:

MARIANUM – Pohřebnictvo města Bratislavy,
príspevková organizácia

Šafárikovo nám. č. 3

811 02 Bratislava

Slovensko

Organization Identification No.: 173 301 90

Tax ID No.: SK2020838182


Payable due to:	22.11.2019
Date of issuance:	08.11.2019
Date of discharge realization:	08.11.2019

We invoice you	Units	Cost of Unit	Total
Fakturuje Vám za dodávku a montáž podľa objednávky 661/2019 ze dne 28.8.2019			
konečná faktúra		18 285,00 €	18 285,00 €
celkom bez DPH			18 285,00 €
DPH 0%			0,00 €
Total			18 285,00 €

fakturované plátno je prevedené POP dle §92a a §96a zákona č.235/2004Zb

ČÍSLO SPISU:	1681/2019
PRILOHY/LISTY:	2
12-11-2019	
VYBAVUJE:	MIRZL ATVIKOVÁ

FAKTÚRA

Dodávateľ	 SMIKOVA1/8 83102 BRATISLAVA	IČO	36716866	Faktúra číslo:	04/2019
Obch. reg. OS Ba I vložka č.: 43852/B		IČ DPH	SK 2022297915	Druh dodávky	
		Peňažný ústav	VÚB Bratislava	Konštantný symbol - kód	0308
		IČAN/BIC			BX
Prijemca	MARIANUM 811 02 BRATISLAVA	Odberateľ:			
Konečný prijemca	MARIANUM 811 02 BRATISLAVA	IČO: 173 301 90	IČ DPH: SK2020839182		
Spôsob dopravy (komu)	osobne	Deň splatnosti	9.12.2019		
		Forma úhrady	prev. prík.		
		Deň vystavenia faktúry	25.11.2019		
		Deň odoslania faktúry	25.11.2019		
Miesto určenia	Bratislava	Deň vzniku daňovej povinnosti	25.11.2019		
Označenie dodávky služby		Množstvo	Cena v €		
V zmysle objednávky č. 809/2019 zo dňa 25.10.2019 vystavenej v súlade s ponukovou špecifikáciou ceny Vám za vypracovanie troch vyhotovení PD statického zabezpečenia stropu nad obradnou sálou cintorína VRAKUŇA v Bratislave fakturujeme kontrahovanú čiastku					
			8900,- €		
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, s.r.o.					
ČÍSLO SPISU: 168 / 2019					
PRÍLOHY/LISTY: 2					
26.11.2019					
Platba DPH VYBAVUJE:					
Prílohy: 72 284 / 100 STROJNÝ					
Vystavil: M. Mosnárová					
Pečať a podpis					
STO. 1					
Spolu bez DPH			8900,00 €		
DPH 20% (celkom)			1780,00 €		
Fakturovaná suma celkom			10 680,0 €		

Dodávateľ: Magdaléna Mitsova
Račianska 65
831 02 Bratislava
IČO:46299467 DIČ:

Faktúra č.: 0220 M
daňový doklad

Bank. spojenie:
Číslo účtu: SK 1

Odberateľ:
MARIANUM-
Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p. o.
Šafárikovo nám. č. 3.
811 02 Bratislava
IČO: 17330190

Konštantný symbol : 0308
Faktúra na základe :
Dodací list

Dátum vystavenia : 07. 07. 2020
Dátum splatnosti : 21. 07. 2020
Dátum z d. plnenia:

Fakturujem Vám práce realizované na základe Zmluvy o spolupráci a potvrdeného súpisu prác
za obdobie od 15. marca 2020 do 30.06. 2020

spolu celkom.....4 512. 50,- €

slovom: štyritisíspäťstočvanásť. EUR a 50 centov

prílohy: potvrdený výkaz práce

Nie som platcom DPH

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.	
ČÍSLO SPISU:	951/2020
PRÍLOHY/LISTY:	1
- 8 - 07 - 2020	
VYBAVUJE:	
MARJANKOVA	

.....
dodávateľ

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEĽ:	ODBERATEĽ:	FAKTÚRA:
<p>ALMÁSSY ČEČETKA architekti s.r.o. Štefánikova 33, SK-811 05 Bratislava</p>	<p>Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. Šafárikovo námestie č.3 SK-811 02 Bratislava</p>	<p>Číslo: 202032 Variabilný symbol: 202032 Konštantný symbol: 308 Objednávka číslo:</p>
<p>Spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd BA I Odiel sro, vložka 43094/B</p>	<p>IČO: 173 301 90 DIČ: 20 20 83 81 82 IČDPH:</p>	<p>Dátum vystavenia: 7.10.2020 Dátum dodania: 5.10.2020 Dátum splatnosti: 19.10.2020</p>
<p>Vybavuje: Richard Čečetka 0903 434 777</p>	<p>Vybavuje: Ing. Jerošov Hurta 0911 147 541 projekty@marianum.sk</p>	<p>Forma úhrady: Bankový prevod</p>

Na základe objednávky č. 187/2020 z dňa 3.3.2020 Vám fakturujem dodanie
Realizačného projektu Interiéru Domu smútku na cintoríne Vrakuňa
zákazka č. 20-50-03.

12 600,00 € bez DPH
2 520,00 20% DPH
15 120,00 € k úhrade

1434/2020
S pozdravom
Ing. arch. Richard Čečetka

Práca prevzal:
Faktúru prevzal:

Dňa: 5.10.2020
Dňa: 05.10.2020

V prípade nezaplatenia v stanovenej lehote Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle §369 a §502 obchodného zákonníka
č.513/A zb. vo výške 0,056% za každý deň omeškania



Faktúra číslo :

20200033

Objednávka číslo : 11062020

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Dodávateľ :

FICO-kov, s.r.o.

Varšavská 22
83103 Bratislava
SLOVENSKO
IČO: 47067920

DIČ: 2023740807

IČ DPH: SK2023740807

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 88273/B

Banka : Tatra banka a.s.

SWIFT : TATRSKBX

Jo Marián

Operátor :

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Šafárikovo námestie 76/3
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
SLOVENSKO

IČO: 17330190

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.12.2020

17.12.2020

31.12.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dovož

Číslo účtu : 0000000000000000

IBAN :

Suma k úhrade : 960,00

Variabilný symbol

20200033

Konštantný symbol

0305

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za: Statické zabezpečenie stropu v obradnej sieni v dome smútku vo Vrakuňi v Bratislave

P.A.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Statické zabezpečenie	1,00	ks	950,00	960,00	0	950,00	0,00	950,00

Oslobodená od DPH : 900,00

Celková suma s DPH

960,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

960,00

Prenesenie daňovej povinnosti

Podpis a pečiatka :

MARIANUM, s.r.o.



MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p. s. r. o.

ČÍSLO SPISU: 1924 / 2020

PRÍLOHY/LISTY: 3

29.12.2020

VYBAVUJE

FAKTÚRA

20211102

SOKOL trade Bratislava s.r.o.

Panonska cesta 34

85104 Bratislava

SK

IČO: 51446995

DIČ: 2120728467

IČDPH: SK2120728467

Platca DPH

IBAN:

SWIFT:

BANKA:

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol:

20211102

Odberateľ

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta
Bratislavy

Šafárikovo námestie 3

81102 Bratislava - mestská časť Stará

SK

IČO: 17330190

DIČ:

IČDPH:

Dátum vystavenia

18.11.2021

Dátum dodania


16.11.2021

Dátum splatnosti

31.12.2021

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Faktujeme Vám stavebné práce podľa zmluvy o dielo	1	ks	107 997,95	107 997,95	0%	107 997,95
Očistenie Domu smútku na cintoríne Vrskaľa a súpisu prác						
			Spolu:	107 997,95	0,00	107 997,95

Prenechanie daňovej povinnosti podľa § 68 ods. 12

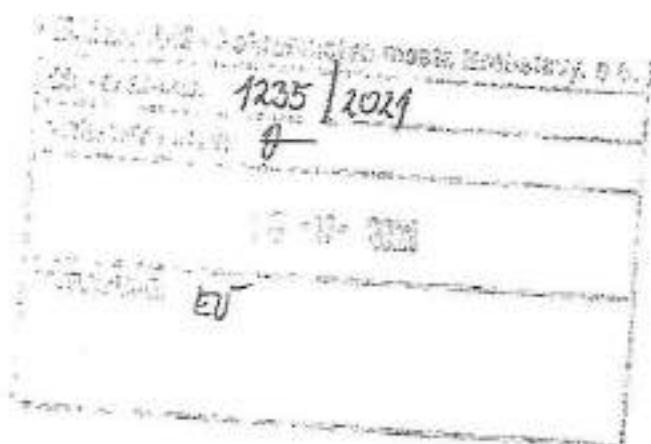

Vyhovel:

Prevzal:

Celková suma bez DPH: 107 997,95 EUR

DPH: 0,00 EUR

Celková suma s DPH: 107 997,95 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

K úhrade:

107 997,95 EUR

stredomorské deväťsto sedemdesiat eur a
deväťdesiatpäť centov

Ing. Martin Sokol



FAKTÚRA

20211202

SOKOL trade
Bratislava s.r.o.
Panonska cesta 34
85104 Bratislava
SK



IČO:
DIČ:
IČDPH:
Platca DPH

IBAN:
SWIFT:
BANKA:

Forma úhrady: peňažný prevod

Variabilný symbol: 20211202

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta
Bratislavy
Šafárikovo námestie 3
81102 Bratislava - mestská časť Staré
SK

IČO:
DIČ:
IČDPH:

Dátum vystavenia

15.12.2021

Dátum dodania

14.12.2021

Dátum splatnosti

29.12.2021

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Faktujeme Vám stavebné práce podľa zmluvy o diele "Obnova Domu smútku na cintoríne Vrakuňa a súpisu prác	1	ks	63 713,62	63 713,62	0%	63 713,62
Spolu:				63 713,62	0,00	63 713,62

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12



PAY by square

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.

ČÍSLO SPISU: 1624/2021

PRÍLOHY/LISTY: 24 G. H.

15.12.2021

VYBAVUJE:

Vyhovíť:

Prevzatí:

Celková suma bez DPH:	63 713,62 EUR
DPH:	0,00 EUR
Celková suma s DPH:	63 713,62 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR

K úhrade:

63.713,62 EURšesťdesiatotrisíc sedemstošesť eur a
šesťdesiatšesť centov

Ing. Martin Sokol

15.12.2021

KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 15.11.-15.12.2021

Názov stavby: Obnova Domu smútku na cintoríne Vrakuňa

JKSO

ECO

Miesto

Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Merlanum

Projektant

SOKOL trade Bratislava s.r.o.

Zhotoviteľ

Parádska cesta 34
851 04 Bratislava

Spracoval

Ing. Martin Sokol

Rozpočet číslo

Dňa

15.12.2021

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	15 645,56	8	Práce ozčes	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	28 591,99	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	1 780,64	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Stoženie podmienky	0,00
4		Montáž	15 281,03	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	TM	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 288,40				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		63 557,62	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompi. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	126,00
Projektant						D Celkové náklady			
Datum a podpis			Pečaťka			23 Súčet 7, 12, 19-22			63 713,62
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 63 713,62			12 742,73
Datum a podpis 15.12.2021						25 Cena s DPH (r. 23-24)			76 456,35
Zhotoviteľ			SO - SLOVENSKO S.R.O.			E Prípochy a odpochy			
Datum a podpis						26 Dodávky objednávateľa			0,00
						27 Kázeň doložka			0,00
						28 Zvýhodnenie +-			0,00

AKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEĽ:	ODBERATEĽ:	FAKTÚRA:
ALMÁSSY ČEČETKA architekti s.r.o. Štefánikova 33, SK-811 05 Bratislava IČO: 36 698 423 Spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd BA I Odvetvový záznam 43094/B	Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. Šafárikovo námestie č.3 SK-811 02 Bratislava IČO: 173 301 90 Vybavuje: Ing. Jaroslav Hurta 0911 147 541 projektv@marianum.sk	Číslo: 201927 Variabilný symbol: 201927 Konštantný symbol: 308 Objednávka číslo: Dátum vystavenia: 11.12.2019 Dátum dodania: 11.12.2019 Dátum splatnosti: 25.12.2019 Forma úhrady: Bankový prevod

Na základe zmluvy o dielo č. 19/051 a požiadavke investora z 6.6.2019
vám fakturujem dodanie revízie realizačného projektu R01
Obnovy Domu smútku na cintoríne Vrakuňa

720,00 € bez DPH
144,00 20% DPH
864,00 € k úhrade

1778/2019

PRÍLOHY LISTY: 8

11-12-2019

VYBAVUJE:

Ing. arch. Richard Čečetka

S pozdravom

Práce prevzal:
Faktúru prevzal:

Dňa: 11.12.2019
Dňa: 11.12.2019

V prípade nezaplatenia v stanovenej lehote Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle §369 a §502 obchodného zákonníka
č.513/A zb. vo výške 0,056% za každý deň omeškania

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

ODDÁVATEĽ:	ODBERATEĽ:	FAKTÚRA:
ALMÁSSY ČEČETKA architekti s.r.o. Štefánikova 33, SK-811 05 Bratislava IČO: 36 698 423	Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o. Šafárikovo námestie č.3 SK-811 02 Bratislava IČO: 173 301 90 Vybavuje: Ing. Jaroslav Hurta 0911 147 541 projektv@marianum.sk	Číslo: 202015 Variabilný symbol: 202015 Konštantný symbol: 308 Objednávka číslo: Dátum vystavenia: 18.5.2020 Dátum dodania: 11.5.2020 Dátum splatnosti: 1.6.2020 Forma úhrady: Bankový prevod

Na základe objednávky č. 321/2020 z 27.4.2020 Vám fakturujem dodanie revízie R02
Realizačného projektu opláštenia Domu smútku na cintoríne Vrakuňa
doplneného o sanáciu nosnej strešnej konštrukcie, statika strechy.

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.	
ČÍSLO SPOLU:	687/2020
PRÍLOHY/LISTY:	✓
18-05-2020	
VYBAVUJE:	
HARIANUKOVÁ	

1 820,00 € bez DPH
364,00 20% DPH
2 184,00 € k úhrade

s pozdravom
Ing. arch. Richard Čečetka

ALMÁSSY ČEČETKA
architekti s.r.o.

Práce prevzal:
Faktúru prevzal:

Dňa: 18.05.2020
Dňa: 18.05.2020

V prípade nezaplatenia v stanovenej lehote Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle §369 a §502 obchodného zákonníka
č.513/A zb. vo výške 0,056% za každý deň omeškania

je to súhrn objednávky 321 v čiastke 39800,- Realizácia prác súvisí s
tým, že spoločnosť Marianum má záujem o realizáciu projektu

Dodávateľ:

GEOMETRES s.r.o.

Nám. hraničiarov 18, 851 03 Bratislava

Tel.: 0903 470 320, 0905 979 031

mail: andrej.gata@gmail.com, wrabel.nichol@gmail.com

IČO: 47849746

3405

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Dátum splatnosti: 11.06.2020

Forma úhrady: PP

Dátum dodania služby/tovaru: 27.05.2020

Dátum vyhotovenia: 27.05.2020

FAKTÚRA č. 120200126

variabilný symbol: 120200126

konštantný symbol: 308

Objednávka 416/2020, dňa 26.05.2020

Zmluva zo dňa 26.05.2019

Odberateľ:

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta
Bratislavy p.o.

Šafárikovo námestie 3

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, p.o.
81102 Bratislava - mestská časť

Staré Mesto

ČÍSLO SPISU:

PRÍLOHY/LISTY:

752/2020

2

IČO: 17330190

27.05.2020

MARIAN KOVAČ

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme nasledovné geodetické práce:

- vyhotovenie podkladu pre projekt - Cintorňa - Vrakuňa - zameranie vybraných výškových bodov na
dome smútku v cintoríne Vrakuňa, v okrese Bratislava II, v katastrálnom území Vrakuňa

	Cena bez DPH	Množstvo	Celková cena bez DPH
vykonané geodetické práce spolu	985.00 €	1.0	985.00 €

Celková cena bez Dph:

985.00 €

Celková DPH 20%:

197.00 €

Celkom k úhrade s DPH

1 182.00 €

Podpis

AKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEĽ:	ODBERATEĽ:	FAKTÚRA:
ALMÁSSY ČEČETKA architekti s.r.o. Štefánikova 33, SK-811 05 Bratislava IČO: 36 698 423	Marianum - pohrebništvo mesta Bratislavy, p.o. Šafárikovo námestie č.3 SK-811 02 Bratislava IČO: 173 301 90 Vybavuje: Ing. Jaroslav Hurta 0911 147 541 projekty@marianum.sk	Číslo: 202045 Variabilný symbol: 202045 Konštantný symbol: 308 Objednávka číslo: Dátum vystavenia: 14.12.2020 Dátum dodania: 11.12.2020 Dátum splatnosti: 28.12.2020 Forma úhrady: Bankový prevod

Na základe objednávky č. 321/2020 z 27.4.2020 Vám fakturujem dodanie
Realizačného projektu obnovy vnútornej časti objektu
Domu smútku na cintoríne Vrakuňa v Bratislave

31 346,67 € bez DPH
6 269,33 20% DPH
37 616,00 € k úhrade

MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy, p.o.	
ČÍSLO SPISU:	1805/2020
PRÍLOHY/LISTY:	1
S pozdravom Ing. arch. Richard Čečetka	
14.12.2020	
VYBAVUJE:	
MARIBUKOVÁ	

Práce prevzal:
Faktúru prevzal:

Dňa: 14.12.2020
Dňa:

V prípade nezaplatenia v stanovenej lehote Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle §369 a §502 obchodného zákonníka
č.513/A zb. vo výške 0,056% za každý deň omeškania



FAKTÚRA 20220401

SOKOL trade Bratislava s.r.o.

Penionska cesta 34

85104 Bratislava

SK

IČO: 51446995

DIČ:

IČDPH:

Platiteľ DPH

Forma úhrady:

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

IBAN:

SWIFT:

BANKA:

Dátum vystavenia:

Dátum dodania: 14.3.2022

Dátum splatnosti: 25.5.2022

Odberateľ

MARIANUM - Pohrebničné

mesto Bratislava

Sofárikovo námestie 3

81102 Bratislava - mestská

časť Staré

SK

IČO:

17330190

DIČ:

IČDPH:

Popis položky	množstvo / MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Fakturuje sa Vám stavebné práce podľa zmluvy o dielo	1 ks	55 223,61	55 223,61	0%	55 223,61
*Obnova Domu smútku na cintoríne Vrekuša a súpisu prác					
Spolu:			55 223,61	0,00	55 223,61

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12

MARIANUM - Pohrebničné mesto Bratislava, p.o.
Číslo objednávky: 547/2022
PRÍLOHY/LISTY:
23-04-2022
VYBAVUJE:



Daň odvedie zákazník.

Prenesená daňová povinnosť, základ DPH je 55 223,61 EUR.

Celková suma bez DPH:	55 223,61 EUR
DPH:	0,00 EUR
Celková suma s DPH:	55 223,61 EUR
Uhradené zálohami:	0,00 EUR

Vyhovuje: Ing. Martin Sokol

Prevzal:

K úhrade: 55 223,61 EUR
päťdesiatpäťtisíc dvadsiťdva eur a
šesťdesiatjeden centov

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 16.12.2021-16.3.2022

Názov stavby: Obnova Doru smútku na cintoríne Vrakuňa

JKSO

EČO

Miesto

Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Marlanum

Projektant

Zhotoviteľ: Sokol trade Bratislava s.r.o.

Spracoval: Ing. Martin Sokol

51446995

SK2120728467

Rozpočet číslo

Dňa


15.03.2022

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HGV	Dodávky	735,88	8	Práce ozvlášť	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	19 325,17	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	6 684,44	10	Kubúra pamiatok	0,00	15	Stažené podmienky	0,00
4		Montáž	27 047,50	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 450,60				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		55 223,59	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka		23		Súčet 7, 12, 19-22	55 223,61
						24		DPH 20,00 % z 55 223,61	11 044,72
Objednávateľ						25		Cena s DPH (r. 23-24)	66 268,33
Dátum a podpis 29.03.2022						E		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ				SOKOL trade Bratislava s.r.o. Penónska cesta 34 851 04 Bratislava IČO: 51 446 995		26		Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis						27		Klzáre doložka	0,00
						28		Zvýhodnenie + -	0,00

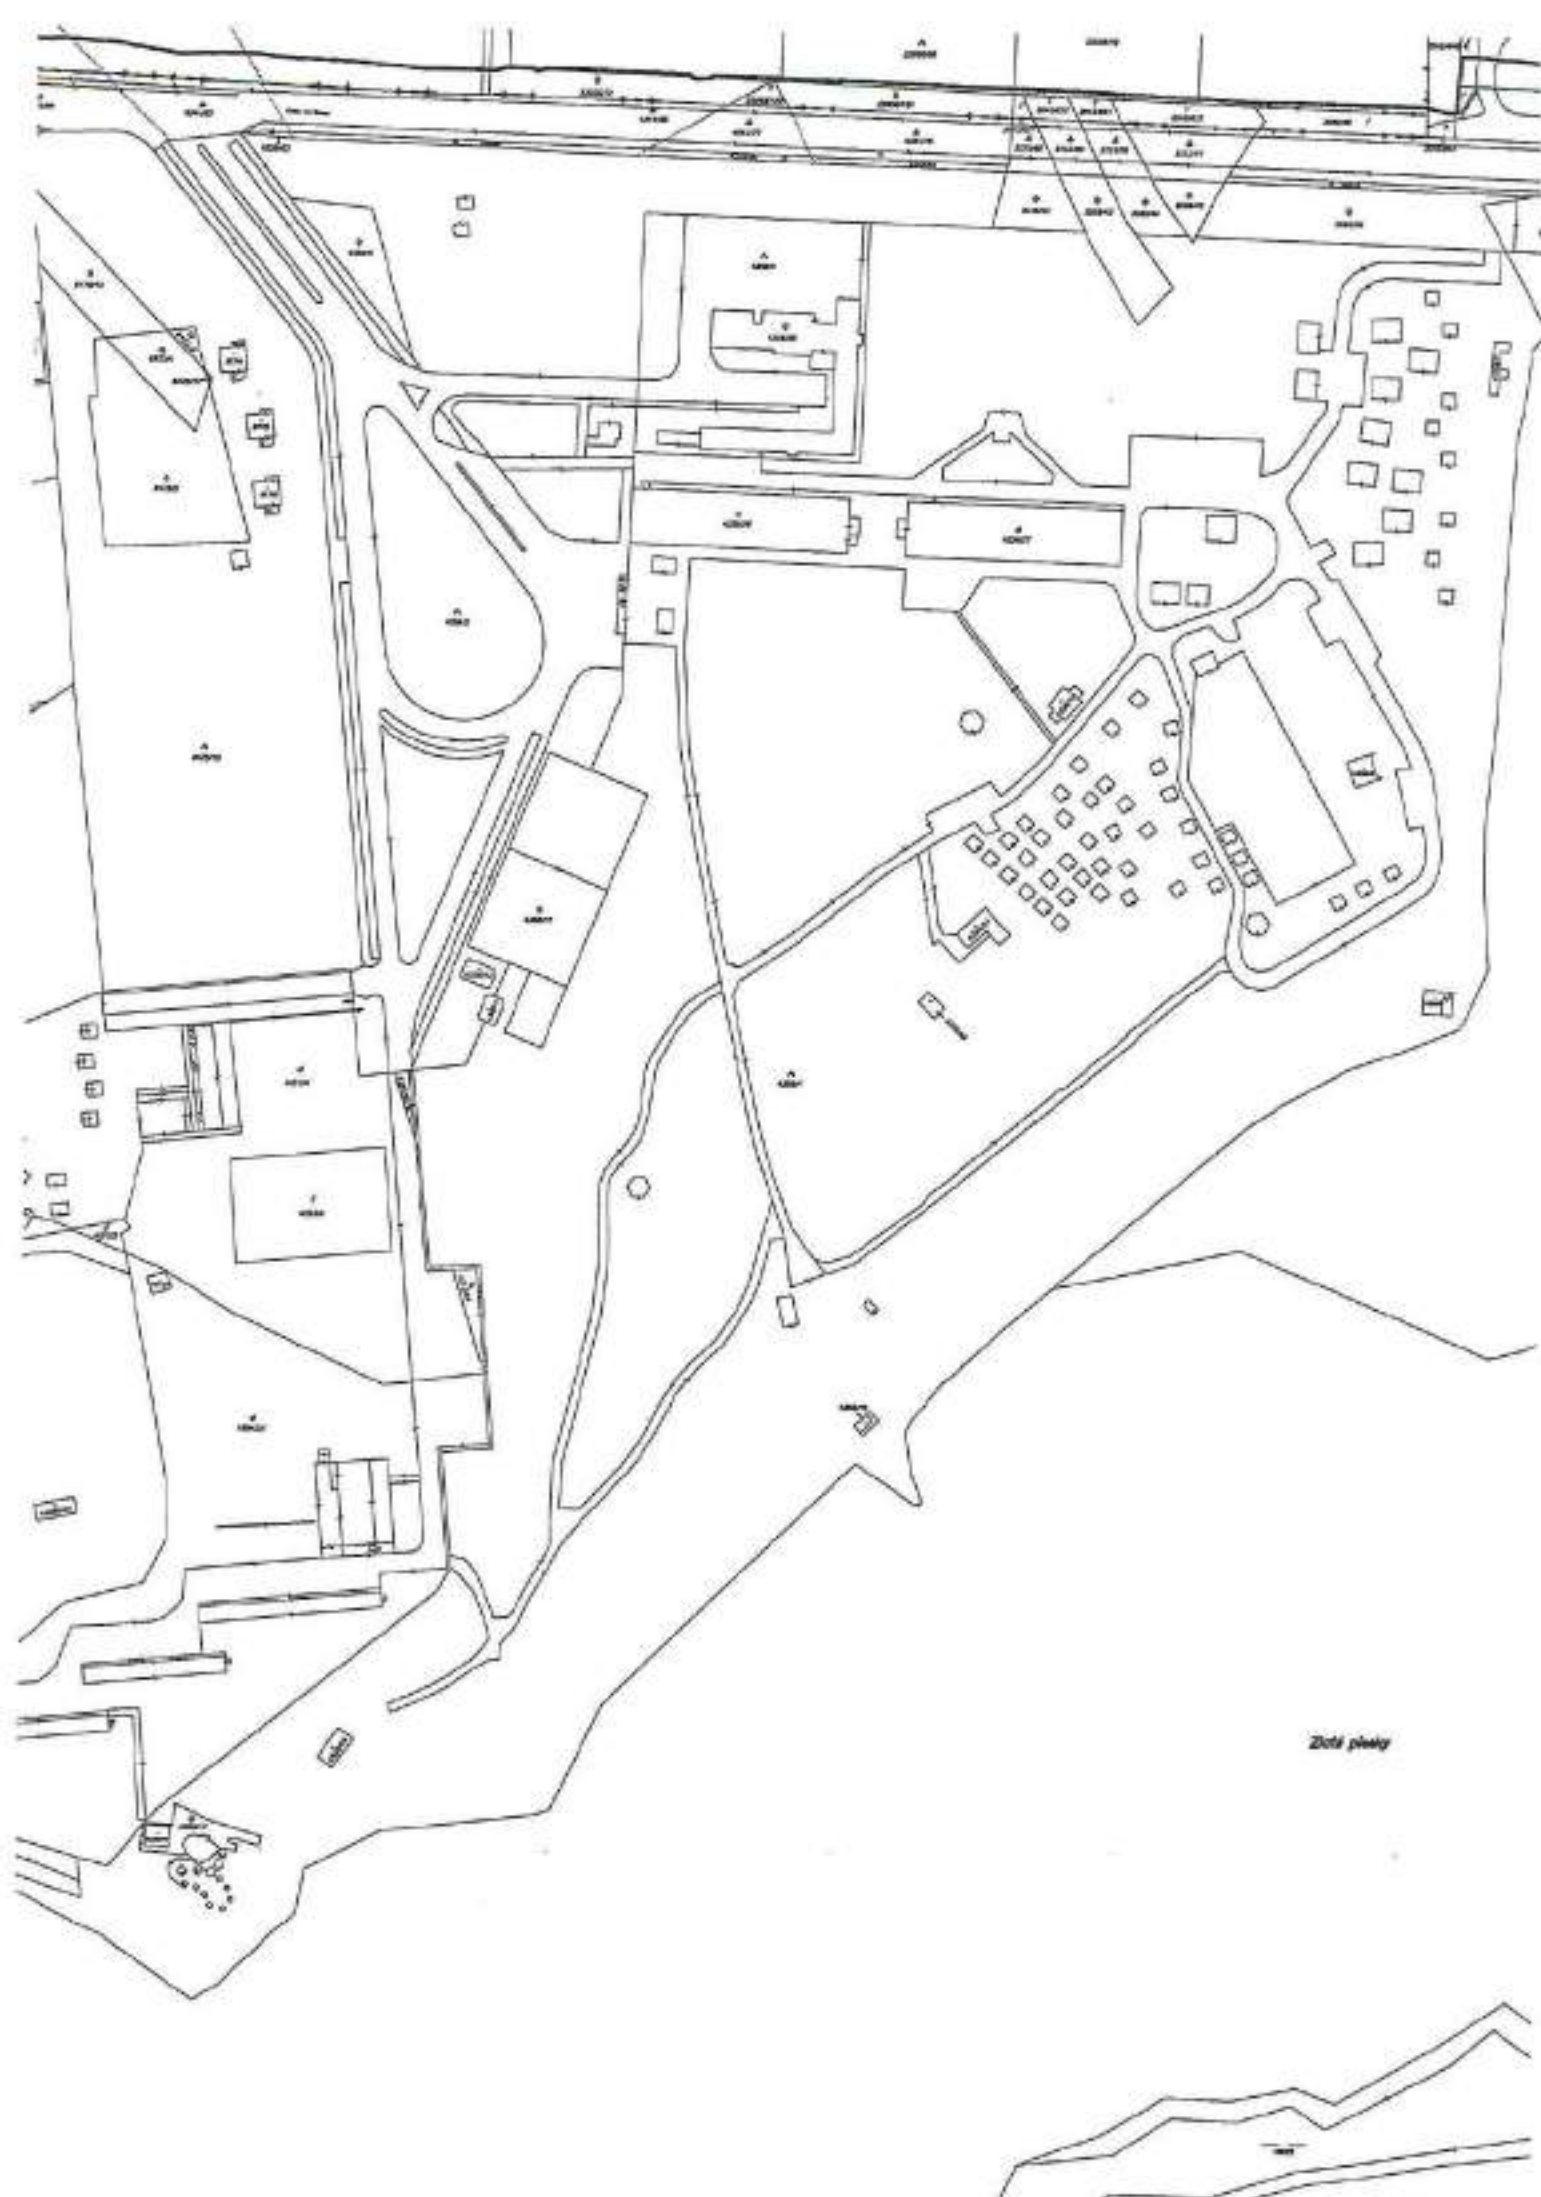

ROZPAD ZDROJOV FINANCOVANIA
Stavebné úpravy Domu smútku súp.č.8842 na cintoríne Vrakuňa,
k.ú. Vrakuňa

Kapitálový transfer

PD	Číslo faktúry	Dodávateľ	Realizovaná služba	Suma v EUR bez DPH
500190804	0219	Mitsova Magdaléna	Konzultácie – výmena výplne otvorov na DS	375,00*
Potvrdené náklady				375,00*
500191300	0319	Mitsova Magdaléna	Spracovanie opisu zákazky pre VO	375,00*
Potvrdené náklady				375,00*
500191300	0319	Mitsova Magdaléna	Podklady – I. etapa rekonštrukcie	625,00*
Potvrdené náklady				625,00*
500191476	201914	ALMÁSSY ČEČETKA, architekti s.r.o.	Realizačný projekt opláštenia DS	4 200,00
Potvrdené náklady				4 200,00
500191475	201915	ALMÁSSY ČEČETKA, architekti s.r.o.	Architektonická štúdia	7 000,00
Potvrdené náklady				7 000,00
500191666	0419	Mitsova Magdaléna	Stavebný dozor	2 240,00
Potvrdené náklady				2 240,00
520190011	19029	Falcon trade, s.r.o.	Dodávka a montáž AL stavebných otvorov	18 285,00*
Potvrdené náklady				18 285,00*
500191839	042019	CYKR expert, s.r.o.	PD statiky stropu	8 900,00
Potvrdené náklady				8 900,00
500201141	0220	Mitsova Magdaléna	Príprava podkladov k PD statiky stropu	375,00*
Potvrdené náklady				375,00*
500201725	202032	ALMÁSSY ČEČETKA, architekti s.r.o.	Realizačný projekt interiéru DS	12 600,00
Potvrdené náklady				12 600,00
500202298	20200033	FICO-kov, s.r.o.	Statické zabezpečenie stropu	960,00*
Potvrdené náklady				960,00*
500212220	20211102	SOKOL trade Bratislava s.r.o.	Stavebné práce	107 997,95*
Potvrdené náklady				107 997,95*
500212473	20211202	SOKOL trade Bratislava s.r.o.	Stavebné práce	63 713,62*
Potvrdené náklady				63 713,62*

Kapitálový transfer spolu:	227 646,57
----------------------------	------------

Vlastné zdroje

500191981	201927	ALMÁSSY ČEČETKA, architekti s.r.o.	Revízia realizačného projektu	720,00
Potvrdené náklady				720,00
500200772	202015	ALMÁSSY ČEČETKA, architekti s.r.o.	Revízia realizačného projektu	1 820,00
Potvrdené náklady				1 820,00
500200824	120200126	GEOMETRES, s.r.o.	Geodetické práce	985,00
Potvrdené náklady				985,00
500202241	202045	ALMÁSSY ČEČETKA, architekti s.r.o.	Realizačný projekt opláštenia DS	31 346,67
Potvrdené náklady				31 346,67
50220808	20220401	SOKOL trade Bratislava s.r.o.	Stavebné práce	55 223,61*
Potvrdené náklady				55 223,61*
Vlastné zdroje spolu:				90 095,28

* Dodávateľ nie je platca DPH

Spolu potvrdené investície predstavujú čiastku – 317 741,85 EUR bez DPH, z toho:

Kapitálový transfer: 227 646,57 EUR bez DPH

Vlastné zdroje: 90 095,28 EUR bez DPH

LEGENDA REVÍZIÍ A DOPLNKOV

Č. R./D.	POPIS ZMENY	DÁTUM
000	PRVÉ VYDANÉ	15.1.2019

VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S - JTSK
ABSOLÚTNA NULOVÁ VÝŠKA	+ 0,00 = + 195,20 d n.m. BPV

NÁZOV STAVBY	Obnova Domu smútku na cintoríne Vrakúňa Opláštenie objektu
--------------	---

STAVEBNÍK	MARIANUM - POHREBNÍCTVO HESTA BRATISLAVY, P.O. ŠAFÁRIKOVÉ NÁMESTIE Č.3, 811 02 BRATISLAVA
-----------	--

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	REALIZAČNÝ PROJEKT	ZÁKAZKA Č.: 19/051-02
---------------------	--------------------	-----------------------

GENERÁLNY PROJEKTANT	ALMÁŠSY ČEČETKA ARCHITEKTI, S.R.O. ŠTEFÁNKOVA 33, 811 05 BRATISLAVA
AUTOR OBJEKTU	KAMIL ČEČETKA
AUTORI OBNOVY	KAMIL ČEČETKA, RICHARD ČEČETKA
HLAVNÝ ING. PROJEKTU	Ing. arch. RICHARD ČEČETKA

ČASŤ PROJEKTU	
---------------	--

OBJEKT	DOM SMÚTKU VRAKUŇA
--------	--------------------

PROFESIA	E.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE
----------	---------------------------------------

SPRACOVATEĽ	ALMÁŠSY ČEČETKA architekti, s.r.o. ŠTEFÁNKOVA 33, 811 05 BRATISLAVA
-------------	--

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Richard ČEČETKA	PODPIS
-----------------------	----------------------------	--------

NÁZOV VÝKRESU	VÝKAZ VÝMER	MERKA	
		FORMÁT	B x A4
		DÁTUM	9/2019

ČÍSLO VÝKRESU	DSV R P 0 A S R A C A 0 1 2 R 0 0 .
---------------	---

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Obnova Domu smútku na cintoríne Vrakuňa - Opláštenie objektu**

Objednávateľ: **MARIANUM - pohrebniectvo mesta Bratislavy, p.o.**

Zhotoviteľ:

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Obnova Domu smútku na cintoríne Vrakuňa - Opláštenie objektu			
001	Výplne otvorov			
002	Strecha (obradná sieň)			
003	Strecha (hospodárska časť)			
004	Opláštenie objektu, okapový chodník			
005	Bleskozvod			

VÝKAZ VÝMER - Rozpočet - Dom smútku Vrakuňa

Názov položky /skrátený popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Jedn.cena	Jedn.cena
Blieskozvod a uzemnenie - dodávka vrátane dopravy, montáže a presunu po stavbe a vrátane pomocného materiálu a záverečných prác				
Blieskozvod - doplnenie zberacej tyče dĺžky 3m vrátane fixácie a prepojenia vodičom FeZn Ø8	Kompl	2		0
Blieskozvod - doplnenie zberacej tyče dĺžky 1m vrátane fixácie a prepojenia vodičom FeZn Ø8	Kompl	1		0
Svorka SK	ks	14		0
Svorka SZ	ks	11		0
Krabica GBO 5600 VA	ks	11		0
Vodič FeZn P8 na podporkách 16SR - 8	m	120		0
Vodič FeZn P8 na svorkách 247-8	m	70		0
Vodič FeZn P8 v rúrke	m	68		0
Vodič FeZn F10 v zemi vrátane zemných prác	m	208		0
Rúrka FKP 32	m	68		0
Východzia revízia	ks	1		0
Spracovanie PD skutočného vyhotovenia	ks	1		0

ZADANIE

Stavba: Obnova Doma smútu na cintoríne Vrakuša - Opláštenie objektu
Objekt: Výpis zverov

Objednávateľ: MARIANUM - pohrebništvo mesta Bratislavy, p.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	005	622463271	Vyspravenie vnútornej onietky po búracích prácach - vyrovnávacia mata na jemné opravy, hr. 10 mm	m2	25,073		
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--

9

Ostatná konštrukcia a práce-bôranie

2	003	941955001	Leštenie ľahké pískom pomocou, s výškou lisovacej podlahy do 1,20 m	m2	10,800		
3	003	941955004	Leštenie ľahké pracovné pomocou s výškou lisovacej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	91,245		
4	011	952501111	Vylštenie budov pri výške podlahy do 4m	m2	82,045		
5	760	968072955	Demontáž okien vrátane zasklenia, -0,06100t	m2	33,332		
6	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,041		
7	013	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	38,779		
8	013	979082111	Vnútrobetónová oprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,041		
9	013	979082121	Vnútrobetónová oprava sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalší 1 m	t	8,154		
10	013	979089012	Poplatok za sťahovanie	t	2,041		

96

Presun hmôt HSV

11	014	969281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,107		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konštrukcie kámpiarcke

12	764	764410340	Oplášťovanie parapetov z nenikového N profilu, vrátane rehov r.š. 250 mm	m	3,520		
13	764	764410850	Demontáž oplášťovania parapetov re. od 100 do 336 mm, -0,00135t	m	3,520		
14	764	880704202	Presun hmôt pre konštrukcie kámpiarcke v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

767

Konštrukcie doplnkové kovové

15	R	767101001	D+M hliníková okenná výplň s číraním 280/280 mm, pevné zasklenie, termolzol. dvojsklo, čie, delenie zasklenia, kotvené kotvovými plechmi, HI EPDM, parotesná fólia, tepel. most prerušený izolátorom, RAL 7016, matná - ozn. O1	kus	1,000		
16	R	767101002	D+M hliníková okenná výplň s číraním 280/480 mm, pevné zasklenie, termolzol. dvojsklo, čie, delenie zasklenia, kotvené kotvovými plechmi, HI EPDM, parotesná fólia, tepel. most prerušený izolátorom, RAL 7016, matná - ozn. O2	kus	1,000		
17	R	767101003	D+M hliníková okenná výplň s číraním 280/4430 mm, pevné zasklenie, termolzol. dvojsklo, čie, delenie zasklenia, kotvené kotvovými plechmi, HI EPDM, parotesná fólia, tepel. most prerušený izolátorom, RAL 7016, matná - ozn. O3	kus	1,000		

ZADANIE

Stavba: Obnova Domu smútku na cintoríne Vlnatka - Optátenie objektu
 Objekt: Výplne otvorov

Objednávateľ: MARIANUM - pohrebništvo mesta Bratislavy, p.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Špecovať:

Dátum: 23. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	R	767101004	D+M hliníkové okenná výplň s šírením 280/4050 mm, pevné zasadenie, termolizol, dvojsklo, žre, delenie zasklenia, kotvené kotvovými plechmi, HI EPDM, parotesná fólia, tepel. most prerušený izolátorom, RAL 7016, matná - ozn. O4	kus	1,000		
19	R	767101005	D+M hliníkové okenná výplň s šírením 280/3830 mm, pevné zasadenie, termolizol, dvojsklo, žre, delenie zasklenia, kotvené kotvovými plechmi, HI EPDM, parotesná fólia, tepel. most prerušený izolátorom, RAL 7016, matná - ozn. O5	kus	2,000		
20	R	767101006	D+M hliníkové okenná výplň s šírením 240/2700 mm, pevné zasadenie, termolizol, dvojsklo, žre, delenie zasklenia, kotvené kotvovými plechmi, HI EPDM, parotesná fólia, tepel. most prerušený izolátorom, RAL 7016, matná - ozn. O5	kus	3,000		
21	R	767101010	D+M ošetrované hliníkové stena 4050/5550 mm, 2-kríd, dvere, izolač, panely, pevné zasadenie, termolizol, dvojsklo, žre, delenie zasklenia, kotvené kotvovými plechmi, HI EPDM, parotesná fólia, tepel. most prerušený izolátorom, RAL 7016, matná - ozn. O10	kus	1,000		
22	R	767101015	D+M systémová rámová hliníková konštrukcia okna 280/400 mm, pevné zasadenie, termolizol, dvojsklo, žre, delenie zasklenia, kotvené kotvovými plechmi, HI EPDM, parotesná fólia, tepel. most prerušený izolátorom, RAL 7016, matná - ozn. O15	kus	2,000		
23	R	767101020	D+M systémová rámová hliníková konštrukcia okna 280/1270 mm, pevné zasadenie, termolizol, dvojsklo, žre, delenie zasklenia, kotvené kotvovými plechmi, HI EPDM, parotesná fólia, tepel. most prerušený izolátorom, RAL 7016, matná - ozn. O20	kus	1,000		
24	R	767101024	D+M systémová rámová hliníková konštrukcia okna 280/1650 mm, pevné zasadenie, termolizol, dvojsklo, žre, delenie zasklenia, kotvené kotvovými plechmi, HI EPDM, parotesná fólia, tepel. most prerušený izolátorom, RAL 7016, matná - ozn. O24	kus	1,000		
25	767	938767232	Príslušenstvo pre kovovú stavebnú doplnkovú konštrukciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Obnova Dome smútku na cintoríne Vrakúňa - Opláštenie objektu
Objekt: Strecha (obradná sieň)

Objednávateľ: MARIANUM - pohrebništvo mesta Bratislava, p.o.

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 23. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Ostatné konštrukcie a práce-báranie

1	005	949902121	Očistenie stropu od starého vrstvy betónu, dočasnej betónovej štruktúry vnútri, časť edky markízy a strechy, - 0,13500t	m2	46,500		
2	013	979981111	Ovoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	8,009		
3	013	979981121	Ovoz sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	152,171		
4	013	979982111	Vnútrosťahovacie doprava sušiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	8,009		
5	013	979982121	Vnútrosťahovacie doprava sušiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m	t	32,036		
6	013	979983012	Podklad za skladovanie	t	8,009		

PSV

Práce a dodávky PSV

712

Izolácie striech

7	711	712306932	Odstánenie existujúcej strešnej izolácie (zostavená) vrátane odstránenia nečistôt, -0,01000t	m2	157,872		
8	711	712311101	Zhotovenie povlakovú krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetročným	m2	157,872		
9	711	712331020	Penetročný náter SIPLAST PRIMER	l	38,468		
10	711	712331101	Zhotovenie povlaku, krytiny striech plochých do 10° pásom na suchu AP, NAIP alebo tkaniny	m2	8,010		
11	693	6930651006	Geotextília ochranná polypropylénová Taratex PP 500	m2	4,912		
12	711	712331110	Zhotovenie povlakovú krytiny striech plochých do 10° pásom NAIP prikotvením, so zvarným spojom	m2	8,010		
13	711	712331130	Zhotovenie povlaku, krytiny striech plochých do 10° plnosplošným prílepením, PUR lepidlo tixton TK400	m2	157,872		
14	628	62893221100	Monokryl GP 1,5 mm	m2	168,454		
15	711	712341039	Zhotovenie povlaku, krytiny striech plochých do 10° pásom príprav. NAIP na ošlej ploche	m2	157,872		
16	628	62893271000	Kvalitovaný pás pre vonkajší výškový hydroizolačný systém, Elastibit GC40	m2	181,553		
17	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objemoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

713

Izolácie tepelné

18	713	713141131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednotvrstvom prílep., PUR lepidlo tixton TK325	m2	157,872		
19	631	6313570505	Izolácia plochej strechy PIREN BV, hrúbka 100 mm	m2	161,029		
20	713	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednotvrstvom prílep., za studena	m2	4,549		
21	263	2637653440	EPS 150S perovný polystyrén hrúbka 50 mm	m2	4,040		
22	713	998713202	Presun hmôt pre izoláciu tepelnú v objemoch výšky nad 6 m do 12 m	%			

794

Konštrukcie klenbové

23	764	764323520	Opláštenie z hliníkovej farebneho Al plechu, hrúbka 250 mm	kus	12,000		
----	-----	-----------	--	-----	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Obnova domu súditiu na cintoríne Vrakuňa - Oprášenie objektu
Objekt: Strecha (obradná sieň)

Objednávateľ: MARIANJIM - pohrebníctvo mesta Bratislava, p.o.

Zhotoviteľ:

Mesto:

Spracovať:

Dátum: 23. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	784	764361605	Demonáž oplechovania medzi atikami, -0,00110t	kg	12,000		
25	784	966764202	Presun hmot pre konštrukcie ramparske v objednot: výšky nad 11 do 12 m	%			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Obnova Domu smútku na cintoríne Vrakuša - Opláštenie objektu
Objekt: Strecha (hospodárska časť)

Objednávateľ: MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislava, p.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

23. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	005	622463271	Vysprevanie vnútornej omietky po búracích prácach - vyrovnávacie masla na jemné opravy, hr. 10 mm	m2	30,502		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	013	979081111	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	7,978		
3	013	979081121	Odvos sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	151,582		
4	013	979082111	Vnútrostavenskovo doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,978		
5	013	979082121	Vnútrostavenskovo doprava sutiny a vyburaných hmôt za každý ďalších 5 m	t	31,912		
6	013	979089112	Poplatok za skladovanie	t	7,978		

99

Presun hmôt HSV

7	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,830		
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

712

Izolácia striech

8	711	712030832	Odstánenie existujúcej strešnej izolácie (sádlová) vrátane odstránenia nebetôt, -0,01000t	m2	367,862		
9	711	712311101	Zhotovenie povlakovéj krytiny striech plochých do 10° za studena náberom penetročným	m2	367,025		
10	711	712321030	Penetročný náter SPPLAST PRIMER	l	89,259		
11	711	712341559	Zhotovenie povlakovéj krytiny striech plochých do 10° pásom prítav. NAPP na celú plochu	m2	367,025		
12	628	5285271000	Akrylový pás pre vnútorné izolácie krovových systémov, Elastobit GG40	m2	412,579		
13	711	712370080	Zhotovenie povlakovéj krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou ocieľovane lepenou PUR lepidlo teroson TK400 so zvarením spoju	m2	367,025		
14	628	5285221100	Minerálna vlna 1,5 mm	m2	412,579		
15	711	712873231	Detaily k PVC-P fóliam zatekovanie kruhového priestupu (okna, vod, katekát, vstup)	ks	9,000		
16	711	712873234	Detaily k PVC-P fóliam zatekovanie kruhového priestupu (svetlík)	ks	25,000		
17	711	008712261	Presun hmôt pre izoláciu povlakovéj krytiny v objektách výšky do 5 m	%			

713

Izolácia tepelná

18	713	713141131	Minerálna vlna sádlová striech podkrovia do 10° minerálnou vlnou, jednosmerná prílep., PUR lepidlo teroson TK365	m2	367,025		
19	631	6313570605	Izolácia plochy strechy PURÉN MV, hrúbka 100 mm	m2	364,156		
20	713	698713201	Presun hmôt pre izoláciu tepelnú v objektách výšky do 5 m	%			

721

Zdravotech, vnútorná kanalizácia

21	721	721210823	Demontáž stienneho vstupu, -0,02011t	ks	1,000		
22	721	721230086	Vstried. strešného vstupu DN 110	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Obnova Dome smútku na cintoríne Vrakuša - Opatrenie objektu
Objekt: Strecha (hospodárska časť)

Objednávateľ: MARIANUM - pohrebništvo mesta Bratislavy, p.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23. 9. 2019

Č.	KCH	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo odkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	283	2832950372	černý střešní vrst 119/110 PVC S s kuglovou PVC manžetou	ks	1,000		
24	721	998721201	Prísun hmot pre vnútornú korekciu v objektoch výšky do 6 m	%			

767

Konstrukcie doplnkové kovové

25	760	767311823	Demontáž svetla polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, prechod svetla nad 1 do 1,5 m2 -0,0353t	m	120,000		
26	760	767318322	Montáž svetla polykarbonátového bodového, kruhového, štvorcový otvor nad 0,6 do 1 m2	ks	25,000		
27	562	562450211A	Manžetový stredný svetl., kruhový-uzor kupa 3-vrstvou P101A, rozm.A svetlost: Ø 60 cm - cm. Z1	ks	25,000		
28	562	562450211B	Polyesterová manžeta, kruhová (zapálenie hr. 30 mm), Ø=60 cm (kruhový otvor), v=15 cm - cm. Z1	ks	25,000		
29	767	767392903	Ovenotlač krytín stiech z plechov. -0,00705t	m2	8,000		
30	767	998767201	Prísun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Obnova Domu smútku na cintoríne Vlnokňa - Opláštenie objektu
Objekt: Opláštenie objektu, okapový chodník

Objednávateľ: MARIANUM - pohrebnično mesto Bratislava, p.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

23. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce s dodávkou HSV

1

Zemné práce

1	221	113107142	Odsúhlasenie kytu asfaltovania v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100	m ²	59,896		
2	001	132211101	Hĺboenie rýh šírky do 600 mm v hĺbokosti 3 súdrtých - ručným nástrojom	m ³	22,639		
3	001	132211119	Príprava na kĺbovú pri hĺbení rýh 3 do 600 mm ručným nástrojom v hĺbokosti 3	m ³	22,639		
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbokosti 1-4 nad 20-50m	m ³	18,112		
5	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ocele z hĺbokosti 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	18,112		
6	001	162501108	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ocele z hĺbokosti 1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každý ďalší a začiatok 1000 m	m ³	344,128		
7	001	167101101	Nakladanie nestandardného výkopku z hĺbokosti 1-4 do 100 m ³	m ³	18,112		
8	001	171201301	Uloženie sypaliny na skládke do 100 m ³	m ³	18,112		
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17.05) osazné	t	27,186		
10	001	174101102	Zrýp vyvinutou v uzavretých priestoroch a srovnávaním povrchu zálepu	m ³	4,527		
11	001	181101102	Úprava pláse v zárezoch v hĺbokosti 1-4 so zhutnením	m ²	56,598		

2

Zakladanie

12	011	273321411	Bežná základová doska, železová (bez výstuže), tr. C 25/30 - nábehová výšková rampa	m ³	0,986		
13	011	273330001	Príplatok za medzibýv povrchovú úpravu	m ²	5,475		
14	011	273351215	Odstránenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	1,869		
15	011	273351216	Odstránenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	1,869		
16	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvl. seř KARI	t	0,009		

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

17	011	342242033	Príčky z tehál pálených POROTHERM 17,5 Profi P 12 brúsených, sa meľu POROTHERM Profi (175x375x240)	m ²	6,983		
18	011	342948113	Ukrytie prúdku k betónovým konštrukciám plechovými	m	5,460		
19	011	342948115	Ukončenie prúdku ku konštrukciám montážnou penou	m	0,250		
20	012	469391001	Dokončenie podlahy po osadení okien	kus	10,000		

4

Komunikácie

21	221	557142115	Pracovní z kštruktúry spevneného betónom a rozprestretím a zhutnením, C80M C 8/10 (C 66), so zhutnením hr. 250 mm	m ²	139,758		
22	221	573211111	Posúvka efektívnej spojovacej bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v hrúbke od 0,30 do 0,70 kg/m ²	m ²	139,758		
23	221	577161214	Bežná asfaltová po zhutnení Etr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr. 70mm	m ²	139,758		

ZADANIE

Stavba: Obnova Domu smútku na oštorine Vrakuša - Opláštenie objektu
Objekt: Opláštenie objektu, okapový chodník

Objednávateľ: MARIANUM - pohostinstvo mesta Bratislava, p.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

23. 9. 2019

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8

Úpravy povrchov, podlahy, osadenia

24	011	622460121	Zakrytie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zbrzdíš, oplechovanie, atď. zhotovené z leštenia akýmkoľvek spôsobom	m2	33,362		
25	005	622460312	Vonkajšia sanačná omietka stien - obnova krycej vrstvy aplikáciou cementom viazanej reprofilačnej malty Vandex CEMENTLINE MG 4, vysokopevnosť, vysušená, vodotesná, reprofilačná malta triedy R4, hr. do 20 mm	m2	117,110		
26	005	622460313	Vonkajšia sanačná omietka stien - obnova krycej vrstvy aplikáciou cementom viazanej reprofilačnej malty Vandex CEMENTLINE MG 4, vysokopevnosť, vysušená, vodotesná, reprofilačná malta triedy R4, hr. do 30 mm	m2	50,180		
27	005	622460315	Vonkajšia sanačná omietka stien - obnova krycej vrstvy aplikáciou cementom viazanej reprofilačnej malty Vandex CEMENTLINE MG 4, vysokopevnosť, vysušená, vodotesná, reprofilačná malta triedy R4, hr. do 50 mm	m2	55,354		
28	005	622460320	Vonkajšia sanačná omietka stien - obnova krycej vrstvy aplikáciou cementom viazanej reprofilačnej malty Vandex CEMENTLINE MG 4, vysokopevnosť, vysušená, vodotesná, reprofilačná malta triedy R4, hr. do 100 mm	m2	6,152		
29	R	622460200	Lokálne vysprávkovanie menšie ako 0,5 m2 plochy do hĺbky do 3 cm - Vandex CEMENTLINE MG 4	kus	30,000		
30	011	622463054	Tvarové vyspravenie, povrchová úprava Epoxit DP, biely náter StoColor Gryonlo (zberače vody)	m2	61,515		
31	005	622463264	Ochrana obnovených výstužiek a adhézy mostík pre nasledujúce vrstvy - antikordóny náter ochrannou masťou základnej na mŕšňanej báze - Vandex M	m2	68,640		
32	011	622468053A	Systémová povrchová vonkajšia omietka STOLIT K3 vrátane pod omietkovej penetrácie StoPutzfund, farba biela (fasáda)	m2	824,313		
33	011	622468053B	Systémová povrchová vonkajšia omietka STOLIT K3 vrátane pod omietkovej penetrácie StoPutzfund, farba biela (solia)	m2	20,329		
34	011	622468061	Systémová povrchová vonkajšia omietka STOLIT K1,5 + StoIt Mléno brúsená vrátane pod omietkovej penetrácie StoPutzfund, farba biela (chodník, markýzy)	m2	54,955		
35	011	625258001	Systémové riešenie KZS STO, polystyrén EPS hr. 40 mm vrátane armovacej vrstvy StoLevel Uni, armovacej sieťky, kotvenia, bez povrchovej úpravy	m2	23,105		
36	011	625258004	Systémové riešenie KZS STO, polystyrén EPS hr. 70 mm vrátane armovacej vrstvy StoLevel Uni, armovacej sieťky, kotvenia, bez povrchovej úpravy	m2	50,611		
37	011	625258034	Systémové riešenie KZS STO, minerálna vlna hr. 80 mm vrátane armovacej vrstvy StoLevel Uni, armovacej sieťky, kotvenia, bez povrchovej úpravy	m2	456,475		
38	011	625258037	Systémové riešenie KZS STO, minerálna vlna hr. 100 mm vrátane armovacej vrstvy StoLevel Uni, armovacej sieťky, kotvenia, bez povrchovej úpravy - profilácia stiepa	m2	7,820		
39	011	625258046	Systémové riešenie KZS STO, minerálna vlna hr. 20 mm vrátane armovacej vrstvy StoLevel Uni, armovacej sieťky, kotvenia, bez povrchovej úpravy	m2	131,645		

ZADANIE

Stavba: Obnova Dome smútku na cintoríne Vrakuša - Opätistenie objektu
 Objekt: Opätistenie objektu, chodový chodník

Objednávateľ: MARIANUM - potravníctvo mesta Bratislavy, p.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

23. 9. 2019

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Minimálna celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	011	63040011	Deska STO dĺžka hr. 15 mm v spode, náter StoColor Dryonic (malý chrát)	kus	7,900		
41	011	63040012	Deska STO dĺžka hr. 15 mm v spode, náter StoColor Dryonic (veľký chrát)	kus	2,000		
42	011	66025000A	Príslušenstvo k systémovému zatepleniu STC (soklové, rohové, nárokové štíty atď.)	m2	669,440		

9

Osadenie konštrukcie a práce-búranie

43	R	910230005	Demontáž blokového	kpl	1,000		
44	221	918730112	Rúbnice existujúceho keramického krytu úroveň podlažia hĺbky nad 50 do 100 mm	m	127,911		
45	211	931892124	Výplň dierových otvorov z konzolidovaného polystyrénu hr. 50 mm	m2	0,870		
46	R	932115901	Odstránenie existujúceho stropného výstuľu na úroveň stropnej dosky 200/200/400 mm pre osadenie kotvových bodov Z7	kus	10,000		
47	005	938002002	Čistenie betonového podlažia vysokotlakovým vodným dŕhom - silen	m2	900,087		
48	003	941941031	Montáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 15 m	m2	758,838		
49	003	941941191	Príslušenstvo prvý a každý ďalší 1 začiatok metra použitia leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 15 m	m2	1517,716		
50	003	941941631	Demontáž leštenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 15 m	m2	708,838		
51	005	948902121	Čistenie stropu očistenie vnútri betónu jazy, očistenie betónovej skupiny vnútri, čistiť akýkoľvek náter a strechy, - 0,13800t	m2	46,900		
52	013	991048120	Vybúranie náteru podlaží k fasáde, -2,4000t	m3	1,735		
53	013	992081141	Burácke práce so sklenenými krmác, hr. do 120 mm, -0,08200t	m2	0,683		
54	013	995041345	Vybúranie podlaží (na úrovni -150) za účelom osadenia okien -1,5000t	kus	16,000		
55	013	978021191	Odklonenie vonkajších smietok silon, -0,06100t	m2	197,012		
56	013	979081111	Odvosť súľny a vyčistených hmôt na vzdialenosť do 1 km	t	33,313		
57	013	979081121	Odvosť súľny a vyčistených hmôt na vzdialenosť za každý ďalší 1 km	t	632,947		
58	013	979082111	Vnútroštátna doprava súľny a vyčistených hmôt do 10 m	t	33,313		
59	013	979082121	Vnútroštátna doprava súľny a vyčistených hmôt za každých ďalších 5 m	t	133,252		
60	013	979082122	Príslušenstvo k doprave	t	33,313		

99

Presun hmot HSV

61	014	999261111	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plôch výšky do 25 m	t	273,449		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

712

Isolácie strech

62	711	712331106	Zdrovovanie povrch, vyčistenie plochy do 10° samolepiacim izolčným pásom	m2	38,335		
63	628	628521001	BAUDER TOP UD33 izolčový samolepiaci pás	m2	44,085		
64	711	712991060	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek do 600 mm pod kámpienku konštrukcie	m	65,456		

ZADANIE

Stavba: Obnova domu smútku na cintoríne Vrakuňa - Opláštenie objektu
Objekt: Opláštenie objektu, okapový chodník

Objednávateľ: MARIANUM - pohrebníctvo mesta Bratislava, p.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23. 9. 2019

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
65	263	263299000	Kotúčová tesnička - napätý vt do drážky	ks	131,000		
66	607	607262480	Doska OSB 3 Superlamin ECO nabrúsená hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	57,601		
67	711	966712202	Presun hrnár pre konštrukcie kĺmpianstvo v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

762 Konštrukcie tesárske

68	762	762341002	Montáž dobitenia jednoduchých strech, na kontroly drevotrieškovými OSB doskami na paro drážku	m2	10,070		
69	607	607262760	Doska OSB 3 Superlamin ECO P40 nabrúsená hr. 22 mm, 2500x1250 mm	m2	12,067		
70	762	762341611	Demontáž debnárskych strech rovných, oblúkových do 90°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01000	m2	5,485		
71	762	966762202	Presun hrnár pre konštrukcie kĺmpianstvo v objektoch výšky do 12 m	%			

764 Konštrukcie kĺmpianstvo

72	764	764312321	Kryšny hladké z hliníkového farebného Al plechu hr. 1,5 mm, zo svrtkov šírky 570 mm, sklon do 30°, RAL 9003	m2	5,485		
73	764	764430730	Oplechovanie Navies alpa z hliníkového farebného Al plechu hr. 1,5 mm, stojaté drážky, vrátane rohov r.š. 380 mm, RAL 9003 + vyplnenie dutiny PUR penou - cen. K3	m	7,200		
74	764	764430735	Oplechovanie muriva a stiek z hliníkového farebného Al plechu hr. 1,5 mm, vrátane rohov r.š. 480 mm, RAL 9003 + vyplnenie dutiny PUR penou - K4	m	62,000		
75	764	764430741	Oplechovanie muriva a stiek z hliníkového farebného Al plechu hr. 1,5 mm, vrátane rohov r.š. 500 mm, RAL 9003 + vyplnenie dutiny PUR penou - K1	m	40,568		
76	764	764430742	Oplechovanie muriva a stiek z hliníkového farebného Al plechu hr. 1,5 mm, vrátane rohov r.š. 520 mm, RAL 9003 + vyplnenie dutiny PUR penou - K5	m	14,000		
77	764	764430760	Oplechovanie muriva a stiek z hliníkového farebného Al plechu hr. 1,5 mm, vrátane rohov r.š. 750 mm, RAL 9003 + vyplnenie dutiny PUR penou - cen. K2	m	3,988		
78	764	764430850	Demontáž oplechovania stiek, -0,00337t	m	82,671		
79	764	764441410	Výmena plochového chodníka na markize obradnej siene	kus	1,000		
80	764	966764202	Presun hrnár pre konštrukcie kĺmpianstvo v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

81	R	767110201	DH1 oceľový výlez na stínachu 900/900 mm, s rúbkovým náter	kus	1,000		
82	R	767110202	D+M mreža (zvonica), nová pevná mreža zo 6ks oceľových prútov Ø10 stužená 3x plošovo 20x5 mm, kotvená do ŽS, záloženého pôdorysného tvaru, uhol 120°, dĺžka ramena 200 mm, výška 1500 mm - cen. Z2	kus	1,000		
83	R	767110203	D+M mreža (zvonica), nová otvorená mreža zo 6ks oceľových prútov Ø10 stužená 3x plošovo 20x5 mm, kotvená do ŽS, záloženého pôdorysného tvaru, uhol 120°, dĺžka ramena 200 mm, výška 1500 mm, uzamykateľná na výstel' zámkov - cen. Z3	kus	1,000		

ZADANIE

Stavba: Obnova Domu smútku na cintoríne Vrakuňa - Opláštanie objektu
Objekt: Opláštanie objektu, okapový chodník

Objednávatel: MARIANUM - pohrebništvo mesta Bratislavy, p.o.

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23. 9. 2019

△	KČM	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
84	R	767110204	Oprava jestvujúceho oceľového nátrika š. 500 mm s ochranným kočom, odstránenie hrdz, antikorózy naterový systém RAL 7026, v=10,5 m - ozn. Z4	kus	1,000		
85	R	767110205	Oprava jestvujúceho oceľového nátrika, odstránenie hrdz, antikorózy naterový systém RAL 7026, v=3,5 m - ozn. Z5	kus	1,000		
86	R	767110206	D+M kotvový bod Topsafe TSL-BSR10 Ø42mm (zvonica), v=350 mm - ozn. Z6	kus	1,000		
87	R	767110207	D+M kotvový bod Topsafe TSL-BSR10 Ø42mm (obopadávka časť), v=800 mm - ozn. Z7	kus	10,000		
88	R	767110208	D+M kotvový bod Topsafe TSL-BSR10 Ø42mm (obopadávka sieť), v=150 mm - ozn. Z8	kus	11,000		
89	R	767110209	D+M predĺžková železná 300x50 mm, RAL 7026, PZ-AL-900-500-S-7026 - ozn. Z9	kus	2,000		
90	R	767110210	D+M predĺžková železná 365x55 mm, RAL 7026, PZ-AL-355-345-S-7026 - ozn. Z10	kus	2,000		
91	R	767390010	Demontáž a spätná montáž mreže 750/3300 mm	kus	1,000		
92	767	767392003	Demontáž krytí stiech z plechov, -0,00700t	m2	5,485		
93	767	938767302	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			

768 Umelecko-remeselné prvky - UR

94	R	76810UR01a	Umelecká obnova dreveného príku veže (výmena, doplnenie a vyspravenie poškodených častí dreveného umeleckého diela na vrchole zvonice, ochr. náter, výmena oplechovania horných častí, hliník, plech hr. 1,5 mm, RAL 6005) - ozn. UR1	kpl	1,000		
95	R	76810UR01b	Umelecká obnova dreveného príku veže (výmena, doplnenie a vyspravenie poškodených častí dreveného umeleckého diela na vrchole zvonice, ochr. náter, výmena oplechovania horných častí, hliník, plech hr. 1,5 mm, RAL 6005) - ozn. UR1	kpl	1,000		
96	R	998768203	Presun hmot pre umelecko-remeselné prvky v objektoch výšky do 24 m	%			

777 Podlahy syntetické

97	773	777511021	Epoxidový náter	m2	6,525		
----	-----	-----------	-----------------	----	-------	--	--

783 Dokončovacie práce - nátery

98	783	783590010	Protipázný náter	m2	5,000		
----	-----	-----------	------------------	----	-------	--	--

Celkom
